COSTRUCCION DE 4TO. NIVEL CORAAPPLATA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1				
2	**TOTAL 4TO NIVEL CORAAPPLATA**	**56 días?**	**mar 15/8/17**	**mar 31/10/1**
3	**REQUERIMIENTOS GENERALES**	**50 días**	**mar 15/8/17**	**lun 23/10/17**
4	Andamios y Gindolas (Alquiler)	50 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
5	Limpieza Continua y Final	50 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
6	Movimiento Interno de Materiales	50 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
7	Subida de materiales	50 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
8				
9	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**8 días?**	**mar 15/8/17**	**jue 24/8/17**
10	Demolicion de antepecho y area cerca de la escalera para colocar muros y	2 días	mar 15/8/17	mié 16/8/17
11	Picado de fino en área de fundación y Viga de fundación (Usar Pulidora)	2 días	lun 21/8/17	mar 22/8/17
12	Picado de Corniza	1 día?	mar 15/8/17	mar 15/8/17
13	Bote de material demolicion y traslado	2 días	mié 23/8/17	jue 24/8/17
14	Replanteo	2 días	jue 17/8/17	vie 18/8/17
15				
16	**MUROS**	**14 días**	**vie 25/8/17**	**mié 13/9/17**
17	Muros de Bloques 6" SNP	6 días	vie 1/9/17	mié 13/9/17
18	Muros de Bloques 8" SNP	6 días	vie 1/9/17	mié 13/9/17
19	Anclaje de bastones de muros de Bloques y varillas de columnas con material Epoxico (bastones ⌀3/8" @	2 días	vie 25/8/17	lun 28/8/17
20				

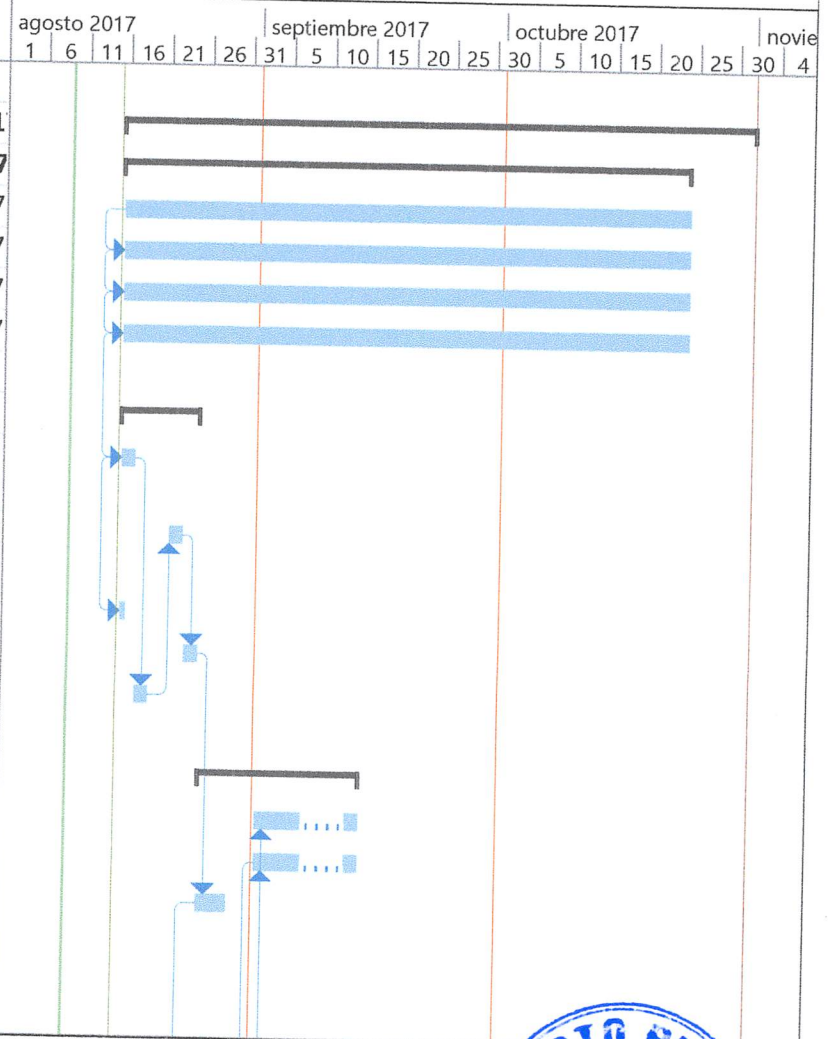

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

PUERTO PLATA F Y DIRECCION GENERAL CORAAPPLATA

ING. WILLIAM DEL ROSARIO

COSTRUCCION DE 4TO. NIVEL CORAAPPLATA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
21	**ESTRUCTURAS (HORMIGON ARMADO)**	**17 días?**	**vie 25/8/17**	**lun 18/9/17**
22	Columnas Perimetrales "C2" (0,20x0,30	8 días	vie 25/8/17	lun 18/9/17
23	Columnas Interiores aisladas "C1" (0,30x0,30)mt	8 días	vie 25/8/17	lun 18/9/17
24	Vigas Perimetrales (Fundacion) (0,20x0,20)mt	5 días	vie 25/8/17	jue 31/8/17
25	Vigas Interiores (Fundacion) (0,50x0,20	5 días	vie 25/8/17	jue 31/8/17
26	Viga Dintel Corrido (0,20x0,30)mt	3 días	jue 7/9/17	lun 11/9/17
27	Vigas Perimetrales e Interiores Coronacion (0,20x0,40)mt	3 días	jue 14/9/17	lun 18/9/17
28	Losa de piso aligerada con paja de arroz y/o hielo seco, con un toping de hormigon con malla electrosoldada de (0,20x0,20)mt, 10 Cm de Hormigon y 10 Cm de material aligerado.	3 días	jue 14/9/17	lun 18/9/17
29	Baden en techo existente para canalizar el agua pluviar	1 día?	vie 1/9/17	vie 1/9/17
30				
31	**TERMINACIONES DE SUPERFICIE**	**9 días**	**mar 19/9/17**	**vie 29/9/17**
32	Pañete Liso Interior	7 días	jue 21/9/17	vie 29/9/17
33	Pañete Liso Exterior	7 días	jue 21/9/17	vie 29/9/17
34	Fraguache	2 días	mar 19/9/17	mié 20/9/17
35	Cantos	7 días	jue 21/9/17	vie 29/9/17

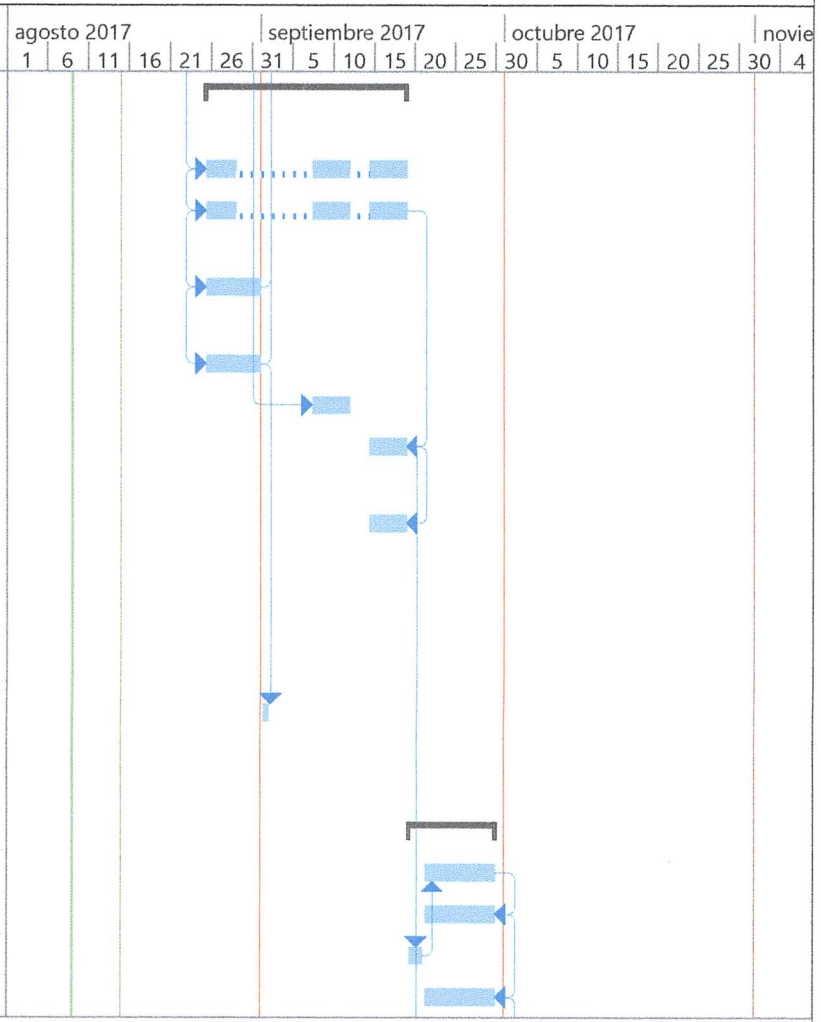

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

PUERTO PLATA F Y DIRECCION GENERAL CORAAPPLATA

ING. WILLIAM DEL ROSARIO

COSTRUCCION DE 4TO. NIVEL CORAAPPLATA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
36	Mochetas	3 días	mié 27/9/17	vie 29/9/17
37	Retalles en ventanas	3 días	mié 27/9/17	vie 29/9/17
38				
39	**TERMINACIONES DE PISO**	**6 días**	**lun 2/10/17**	**lun 9/10/17**
40	Ceramica de Piso	6 días	lun 2/10/17	lun 9/10/17
41	Ceramica de Piso (Baños)	3 días	jue 5/10/17	lun 9/10/17
42	Zocalo de Ceramica en Piso	3 días	jue 5/10/17	lun 9/10/17
43				
44	**ESTRUCTURA METAL PARA TECHO**	**16 días**	**mar 19/9/17**	**mar 10/10/17**
45	3 Porticos con Vigas W10x4x12, Correas 2"x6", aluzinc calibre sin aislante y Placas de asientos con pernos	16 días	mar 19/9/17	mar 10/10/17
46				
47	**REVESTIMIENTOS Y TOPES**	**22 días?**	**lun 2/10/17**	**mar 31/10/1**
48	Ceramica Blanca Mate 25x20 (Baños)	6 días	lun 2/10/17	lun 9/10/17
49	Ceramica de Color 15x15 (Cocina)	1 día?	mar 24/10/1	mar 24/10/1
50	Tope de Marmolite Natural Chino (0.60mt*2.22mt) para meseta de cocina más fregadero	6 días	mar 24/10/17	mar 31/10/17
51	Cenefas para baños	6 días	lun 2/10/17	lun 9/10/17
52	Cenefas para cocina	1 día?	mar 24/10/1	mar 24/10/1
53				
54	**DIVISIONES**	**10 días**	**mar 10/10/1**	**lun 23/10/17**

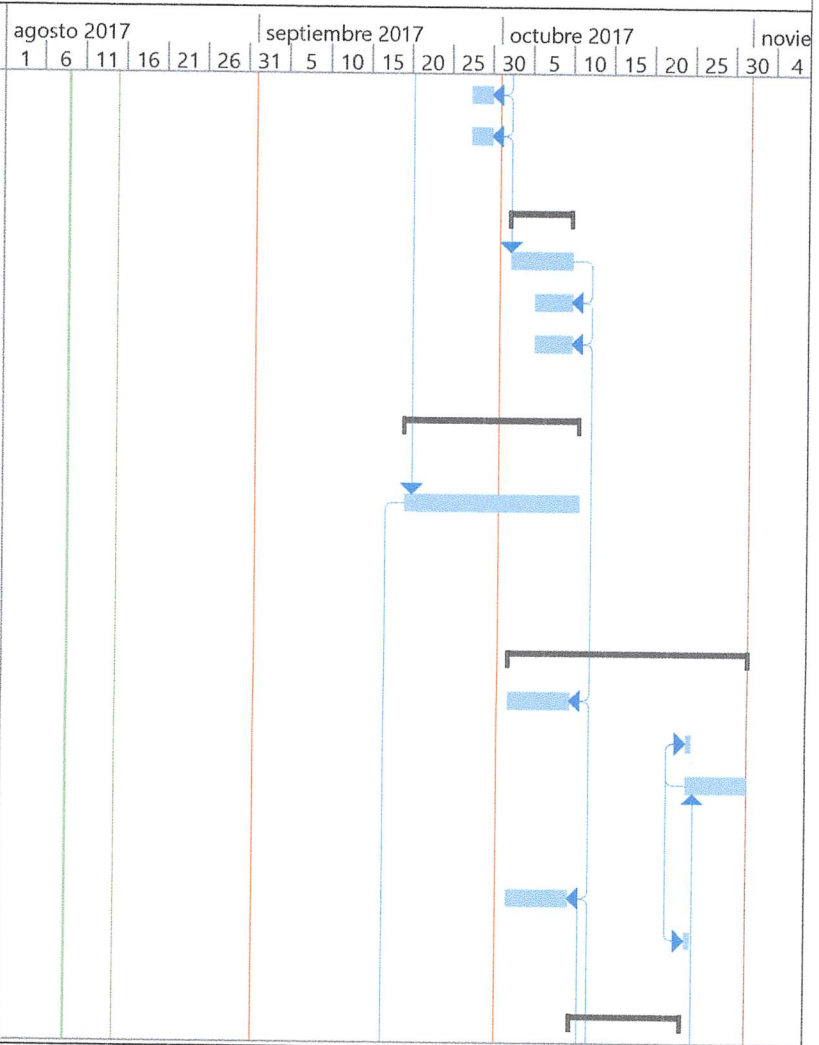

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

PUERTO PLATA F Y DIRECCION GENERAL CORAAPPLATA

ING. WILLIAM DEL ROSARIO

COSTRUCCION DE 4TO. NIVEL CORAAPPLATA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
55	Paredes de division en sheetrock	7 días	mar 10/10/1	mié 18/10/1
56	Paredes flotantes con Cristal templado de 3/8	10 días	mar 10/10/17	lun 23/10/17
57	Techo en sheetrock	7 días	mar 10/10/1	mié 18/10/1
58	Cornisa en sheetrock	7 días	mar 10/10/1	mié 18/10/1
59				
60	**PUERTAS**	**10 días**	**mar 10/10/1**	**lun 23/10/17**
61	Puerta Tipo "P1" Madera	10 días	mar 10/10/1	lun 23/10/17
62	Puerta Tipo "P2" Madera	10 días	mar 10/10/1	lun 23/10/17
63	Puerta Tipo "P3" Cristal/aluminio	10 días	mar 10/10/1	lun 23/10/17
64	Puerta Tipo "P4" Cristal/aluminio	10 días	mar 10/10/1	lun 23/10/17
65	Gabinete de piso (Pino Tratado)	10 días	mar 10/10/1	lun 23/10/17
66	Gabinete de pared (Pino Tratado)	10 días	mar 10/10/1	lun 23/10/17
67				
68	**VENTANAS**	**10 días**	**mar 10/10/1**	**lun 23/10/17**
69	Ventanas Tipo "V1" y "V5", corrediza tradicional con Cristal bronce liso (3	10 días	mar 10/10/17	lun 23/10/17
70	Ventanas Tipo "V2", "V3" y "V4", proyectada con Cristal bronce liso (8 huecos)	10 días	mar 10/10/17	lun 23/10/17
71				
72	**PINTURA**	**10 días**	**mar 10/10/1**	**lun 23/10/17**
73	Pintura Acrilica Interior	7 días	vie 13/10/17	lun 23/10/17
74	Pintura Acrilica Exterior	7 días	vie 13/10/17	lun 23/10/17

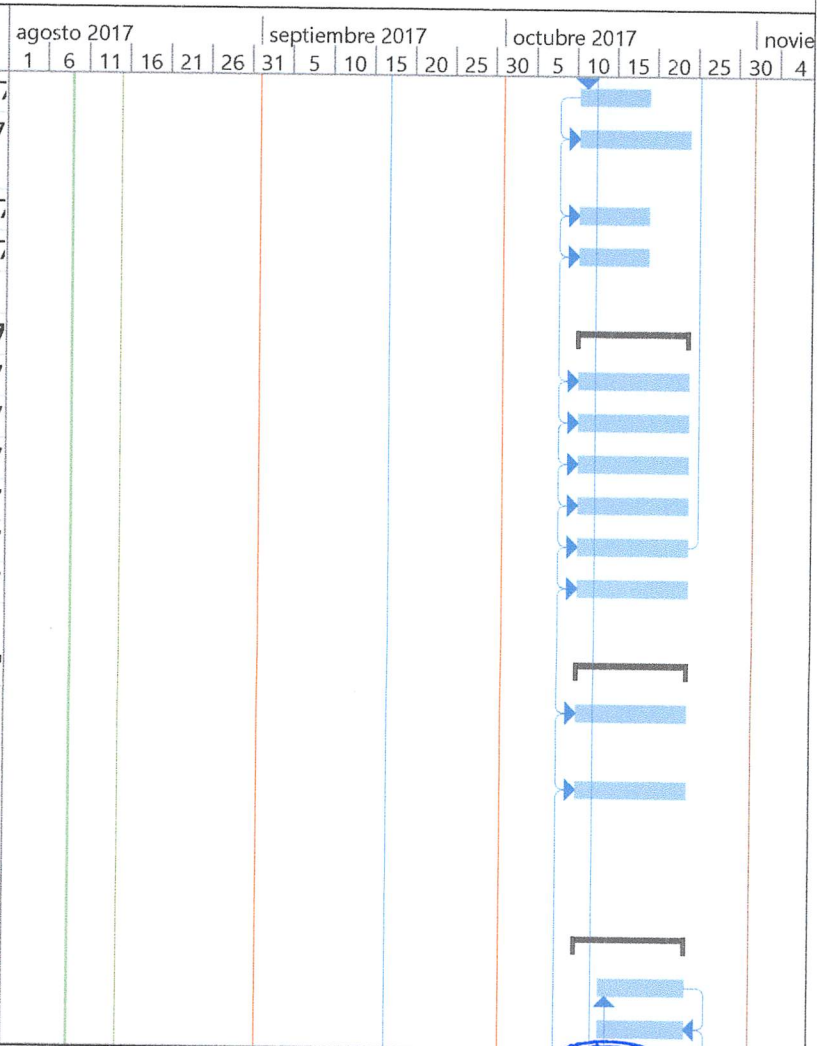

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

PUERTO PLATA F Y DIRECCION GENERAL CORAAPPLATA

ING. WILLIAM DEL ROSARIO

COSTRUCCION DE 4TO. NIVEL CORAAPPLATA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
75	Pintura Acrilica en Techos	7 días	vie 13/10/17	lun 23/10/17
76	Base Primer y aplicación de piedra	3 días	mar 10/10/1	jue 12/10/17
77				
78	**INSTALACIÓN SANITARIA**	**50 días**	**mar 15/8/17**	**lun 23/10/17**
79	Instalaciones Sanitarias Generales: Incluye los sistemas sanitarios, pluviales (techos y bajantes) y de agua	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
80				
81	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES**	**50 días**	**mar 15/8/17**	**lun 23/10/17**
82	Salidas cenitales	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
83	Salidas de tc a 120v	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
84	Salidas de tc a 220v	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
85	Salidas de ups a 120	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
86	Salidas interruptor sencillo	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
87	Salidas interruptor doble	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
88	Salidas interruptor 3w	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
89	Panel de distribución de 24 circuitos con breaker incluido	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
90	Panel ups de distribución de 8 circuitos con breaker incluido	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
91	Salidas datas y teléfono	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
92	Tubería imc de 11/2"	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
93	Tubria pvc sdr 26 de 2"	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17

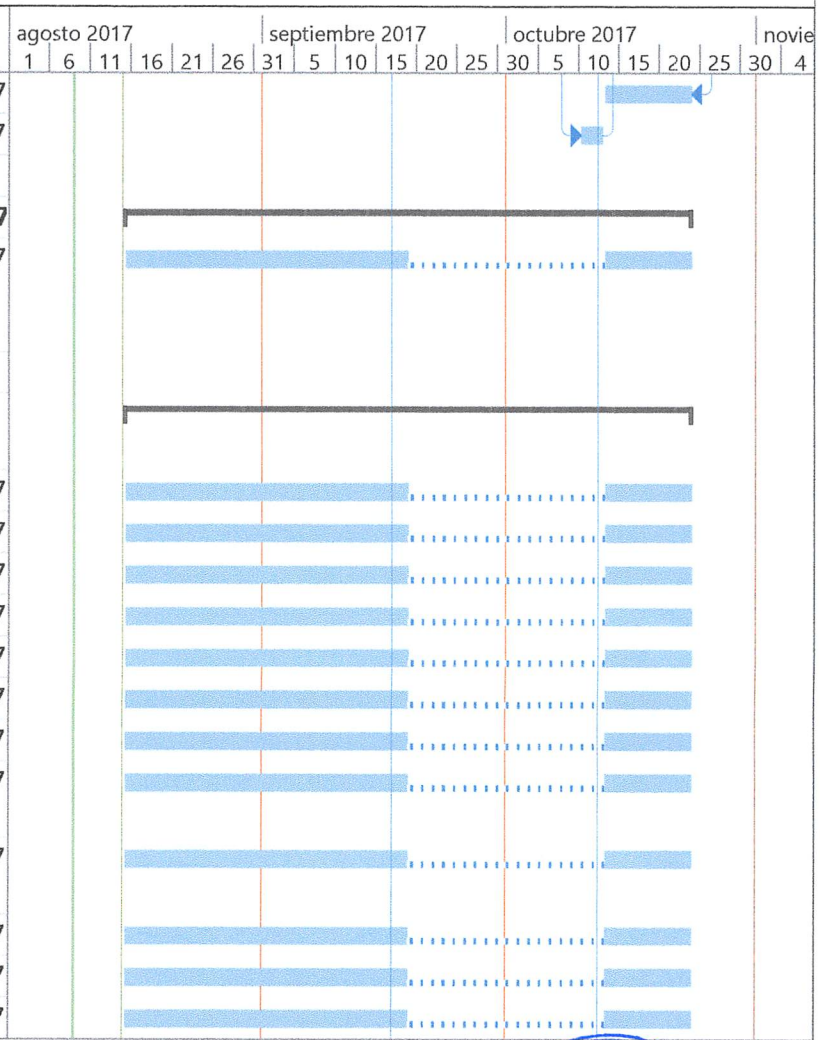

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

PUERTO PLATA · DIRECCION GENERAL · CORAAPPLATA

ING. WILLIAM DEL ROSARIO

COSTRUCCION DE 4TO. NIVEL CORAAPPLATA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
94	Registro de 12x12x6	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
95	Registro de 8x8x6	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
96	Alimentador desde panel existente a pa	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
97	Alimentador desde panel ups existente a pups	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
98	Circuito cenital	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
99	Luminaria interior	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
100	Luminaria exterior	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
101	Luminaria interior sencilla	32 días	mar 15/8/17	lun 23/10/17
102				
103	**INSTALACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADORES DE AIRES**	**7 días**	**vie 13/10/17**	**lun 23/10/17**
104	Instalación y Suministro de unidades de	7 días	vie 13/10/17	lun 23/10/17
105				
106	**INSTALACIÓN ESCALERA ACCESO LADO PARQUEO**	**16 días**	**mar 19/9/17**	**mar 10/10/17**
107	Instalación escalera	16 días	mar 19/9/17	mar 10/10/1
108				
109	**MISCELANEOS**	**1 día?**	**lun 9/10/17**	**lun 9/10/17**
110	Accesorios de Baño (Conjunto, Sum. E Inst.)	1 día?	lun 9/10/17	lun 9/10/17

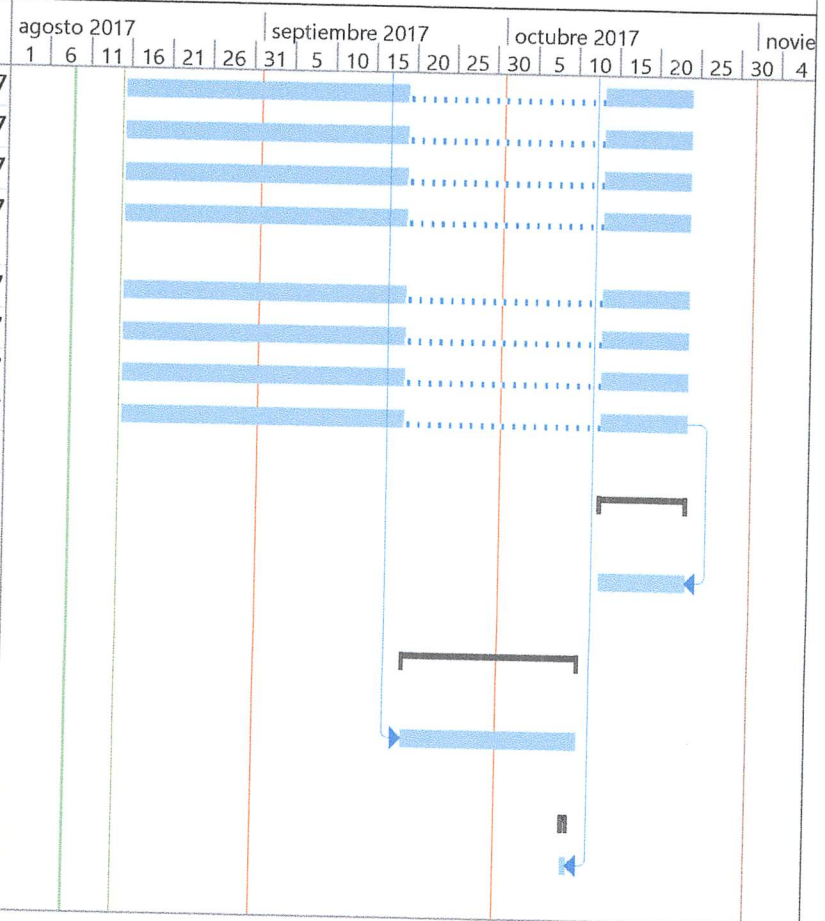

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

PUERTO PLATA · F Y · DIRECCION GENERAL · CORAAPPLATA

ING. WILLIAM DEL ROSARIO
